

<b>Møte:</b>	<b>Avsluttende møte med deltakere i medvirkningsgruppen – Elfys. 5</b>	<b>Prosjekt:</b>	<b>Rokade C1</b>
<b>Møtedato:</b>	11.05.23	<b>Sted:</b>	Bergvillaen RH
<b>Referent:</b>	Thea Ekren Koren		

**Møtedato:** 11.05.2023 15:00

**Plassering:** Bergvillaen RH

### Invitasjonsmelding

*Nå med Teams mulighet, men vi ønsker fysisk deltakelse der det er mulig*

*Hei*

*Dere har medvirket i Rokade C1 på ovennevnte delprosjekt.*

*Styret Helse Sør-Øst RHF godkjente 16.12.22 at prosjekt Rokade ved rivning av C1 på Rikshospitalet legges til grunn for den videre gjennomføringen av prosjektet. Helse Sør-Øst RHF overtar prosjekteierskapet og organiserer Rokade C1 videre som del av prosjektet Nye Rikshospitalet. OUS vil håndtere samhandling med HSØ PO i ulike akser, der Nye OUS har den koordinerende og overordnede rollen. Prosjektet vil følge «Prosedyre for samhandling mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF» (HSØ PO).*

*Dere inviteres i denne forbindelse til oppsummerende avslutningsmøte for medvirkningsprosessen som dere har vært del av.*

*Agenda:*

- Gi status for delprosjektet*
- Oppsummere aktiviteter som har behov for videre bearbeidelse og avklaring.*

*Vel møtt*

### Deltakere (Skjul)

[Stian Ilebrekke](#) (Møtearrangør)

[Erik Lyseggen](#)

[Erik Kongsgård](#)

[Nils Einar Wilhelmsen](#), klinikkontakt HLK

[Anne Gro Valla](#)

[Einar Gude](#), seksjonsleder KAD

[Arne Kristian Andreassen](#)

[Trude Søvik](#), sykepleier - drift

[Martine Warnken](#), verneombud OUS

[Koren, Thea](#), HSØ PO, referent

Bjørn Aage Feet, programleder NRH, Nye OUS

[Anna Viveka Dahl](#), enhetsleder

[Per Oddvar Synnes](#), prosjektverneombud OUS - meldt forfall

Martin Lieungh, fagkoordinator Nye OUS

Morten Nagy, prosjektleder OUS

## Referat fra møtet

### Sak 1 Oppsummere status for delprosjektet i Rokade C1

Velkommen til oppsummerende avslutningsmøte for medvirkningsprosessen som dere har vært del av.

- Styret Helse Sør-Øst RHF godkjente 16.12.22 at prosjekt Rokade ved rivning av C1 på Rikshospitalet legges til grunn for den videre gjennomføringen av prosjektet.
- Helse Sør-Øst RHF overtar prosjekteierskapet og organiserer Rokade C1 videre som del av prosjektet Nye Rikshospitalet.
- OUS vil håndtere samhandling med HSØ PO i ulike akser, der Nye OUS har den koordinerende og overordnede rollen.

Prosjektet vil følge «Prosedyre for samhandling mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF» (HSØ PO).

Det ble gitt informasjon om de endringer i medvirkning/samhandlingsansvar som er overført fra OUS til HSØ PO.

*Følgende medvirkning er gjennomført for prosjektet Elfys 5:*

- Det er avholdt 4 prosjekteringsmøter i perioden 5.10.2021 til 2.11.2021
- Deltakere i forprosjektet har vært prosjektleder Terje Dybvik og ARK, RIB, RIV og RIE

Kort historikk presenteres:

Angiolab i C1 – «Lab 39» rives og plasseres i D4, 2. etasje i forlengelsen av arytmigangen. Dette bidrar til en bedre samling av HLKs laboratoriemiljøer, som igjen øker fleksibilitet og bedrer arealutnyttelsen og behov for personalressurser. Støtterom som sengevent og lager må legges til nytt areal og areal økes noe. «Lab 39» skifter navn til «Elfys 5» slik at navn harmonerer med de øvrige labbene i D4.


Plasseringen fortrenger areal i form av kontorer og møterom som kan plasseres i foreslått påbygg i D5, uten at funksjonalitet forringes.

Det skal fristille areal og besørge felles infrastruktur for pacemakerstue D3.2018 (Lab 13). Denne plasseres ved siden av «Elfys 5». Lab 13 er ikke inkludert i oppdraget til konseptutredningen, men det bemerkes at plassering av tidligere Lab 13 ved siden av tidligere Lab 39 vil ha positive driftsgevinster for fagområdene. Lab 13 skifter navn til «Elfys 4».

*Tegninger og status gis i møtet av Morten Nagy (samme ressurs som også har ansvaret for prosjektet internt i OUS med Elfys 4.*

- Det er avklart i tidligere faser med brukere (medvirkere) og smittevern at det blir 100-CFU lab/stue.
- Det er utfordrende med tekniske føringsveier og med kapasitet i eksisterende anlegg, utredninger foregår i prosjektet.
- Det foreligger tegninger og skal gjennomføres leverandørprosjektering

Tegninger av funksjonsområdet i bygg D4 plan 02, der det rosa representerer Rokade C1 prosjekt (angio 5, inngår i prosjekt Rokade C1) og det gule er OUS internprosjekt (angio 4, inngår ikke i Rokade C1, men med finansiering fra OUS):

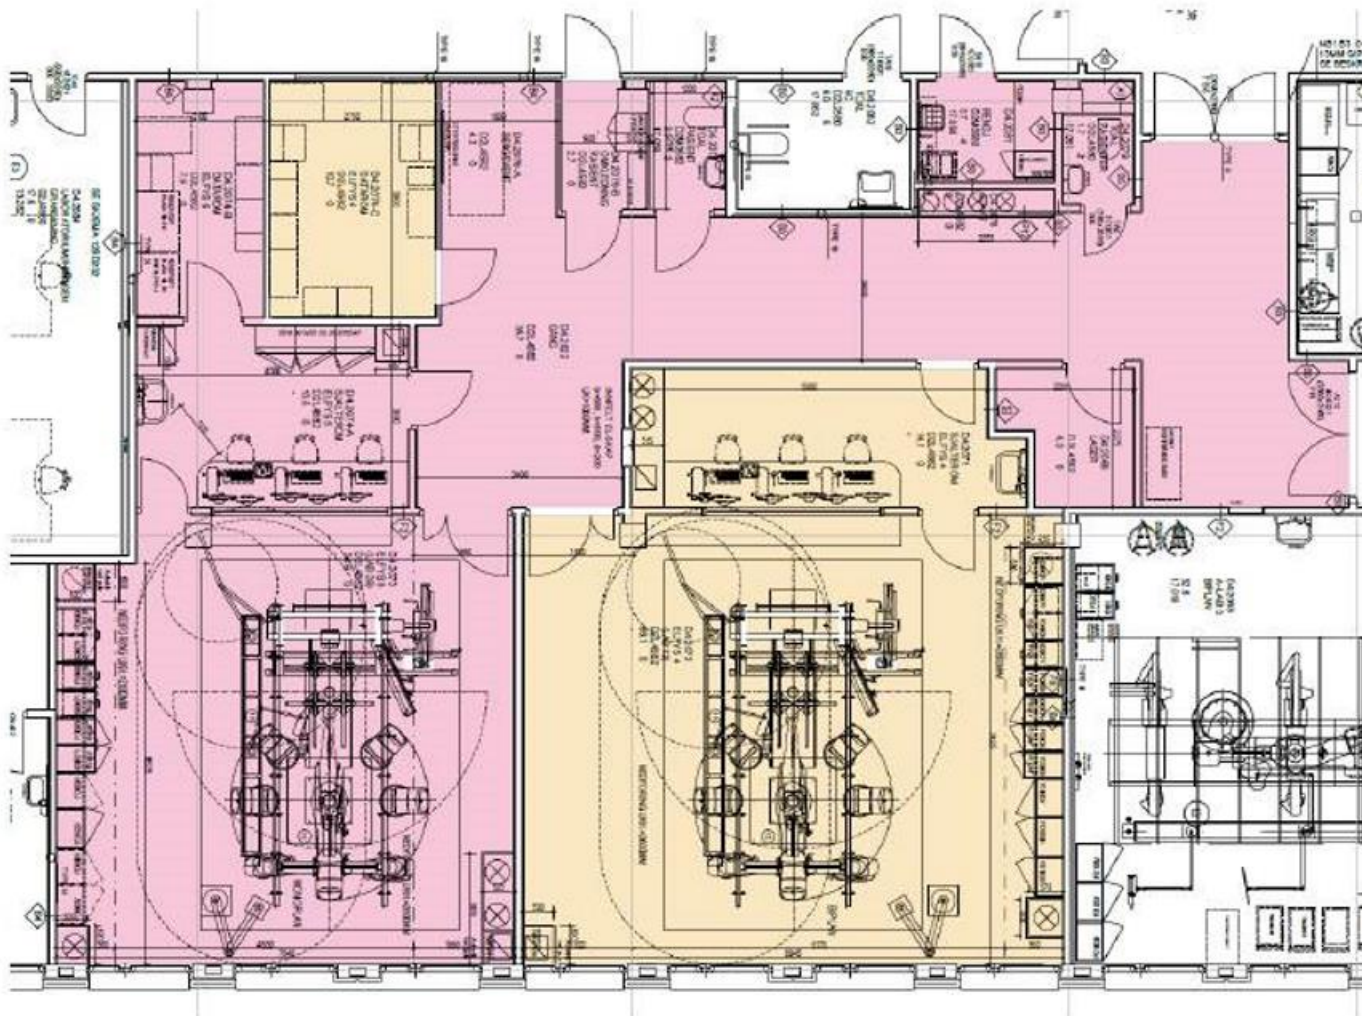

Deltakere i møtet ønsker at klinikkontaktene også har kontakt og involverer evt. Stian Ross som fagressurs, som ikke er i møtet, men som har deltatt i tidligere prosesser om det skal gjøres avklaringer videre.

**Klinikkontaktene er Nye OUS sitt kontaktpunkt inn mot den enkelte klinikk. Deltakere til en overordnet medvirkningsgruppe og særgrupper innen enkelte delprosjekter vil bli innmeldt etter samme mal som i forprosjektet. Ytterligere behov for kontaktpunkter inn mot den enkelte klinikk etableres via Nye OUS og klinikkontaktene. Medvirkning via de brukergrupper som ble benyttet i forprosjektet, er avsluttet.**

Fremdrift ble presentert – kontrahering av rådgivere og overføring av underlag fra forprosjektet juni 2023, detaljprosjektering ut år 2023. Ferdigstille bygging av Elfys 5 og ferdigstilt løsning desember 2024.

ID	Aktivetsnavn	Varighe	Start	Slutt	2023 2024 2025																											
					i	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	i	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	i	f	m	
102	Avtale 6: Klinisk forskningspost og Elfys 5, Rammeavtale, beskrivelse, medgått tid	250 d	14.12.23	31.12.24																												
103	Detaljprosjekte ring	60d	14.12.23	07.03.24																												
104	Anskaffelse	40d	28.03.24	23.05.24																												
105	Bygging Elfys 5	95d	20.06.24	02.12.24																												
106	Bygging Klinisk forskningspost	70d	24.09.24	31.12.24																												

## Sak 2 Oppsummering av aktiviteter som har behov for videre bearbeidelse og avklaring

- Det må avklares tekniske føringsveier og kapasiteter i eksisterende anlegg, dette påvirker handlingsrommet og løsning. Ansvar prosjekterende i samarbeid med OUS driftsavdeling.
- Det må sikres avklaring og vedtak for finansiering av utstyret for elfys 4, det er ikke avklart om eksisterende maskin skal flyttes eller om den skal byttes med ny, prioriteringsutvalget er søkt internt i OUS, men det foreligger ikke beslutning. Dette kan påvirke fremdrift for Elfys 5 om ikke avklaring blir gjort.
- Det må avklares i prosjektet om det skal utarbeides forslag til revidert fremdriftsplan for flytting av fysioterapi, (deler av klinisk service). Det blir gitt signaler i prosjektet om at tidsplan er kritisk jfr. tid og fremdrift (ferdig med all Rokade for fristilling av bygg C1 til frist 01.01.2025), derfor ønsker prosjektet å se på mulighet for å forsere fremdrift med ferdigstillelse august 2024 og ikke desember 2024 som nå ligger i vedtatt plan, dette da som del av risikoreducerende tiltak. Det må avklares konsekvenser som del av hele rokadeflytting og vedtak som er gjort.

Ansvar HSØ PO i samarbeid med Nye OUS, eventuelt må en revidert fremdriftsplan fremmes for beslutning i henhold til beslutningslinje for prosjektet. Det blir også presentert i møtet at det er en rokade med MR i tilbygg D som også kan påvirke fremdrift, dette må sjekkes.
